

完工報告



材質：碳鋼管 內容物：蒸氣

溫度：90~100℃ 壓力：3.5 kg/cm²

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO., LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL: 05-6936161

FAX No: 05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs



1. 機具及閘閥安裝後試壓作業



2. 人員進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs



3. 安裝阻斷器進行阻斷作業



4. 管線末端排壓確認排空情形

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs



5. 管線切管後增設閥件作業



6. 閥件增設後人員進行下堵作業

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs



7.人員安裝內塞頭作業




8.施工完成

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs




9. 人員安裝開孔機後進行試壓作業

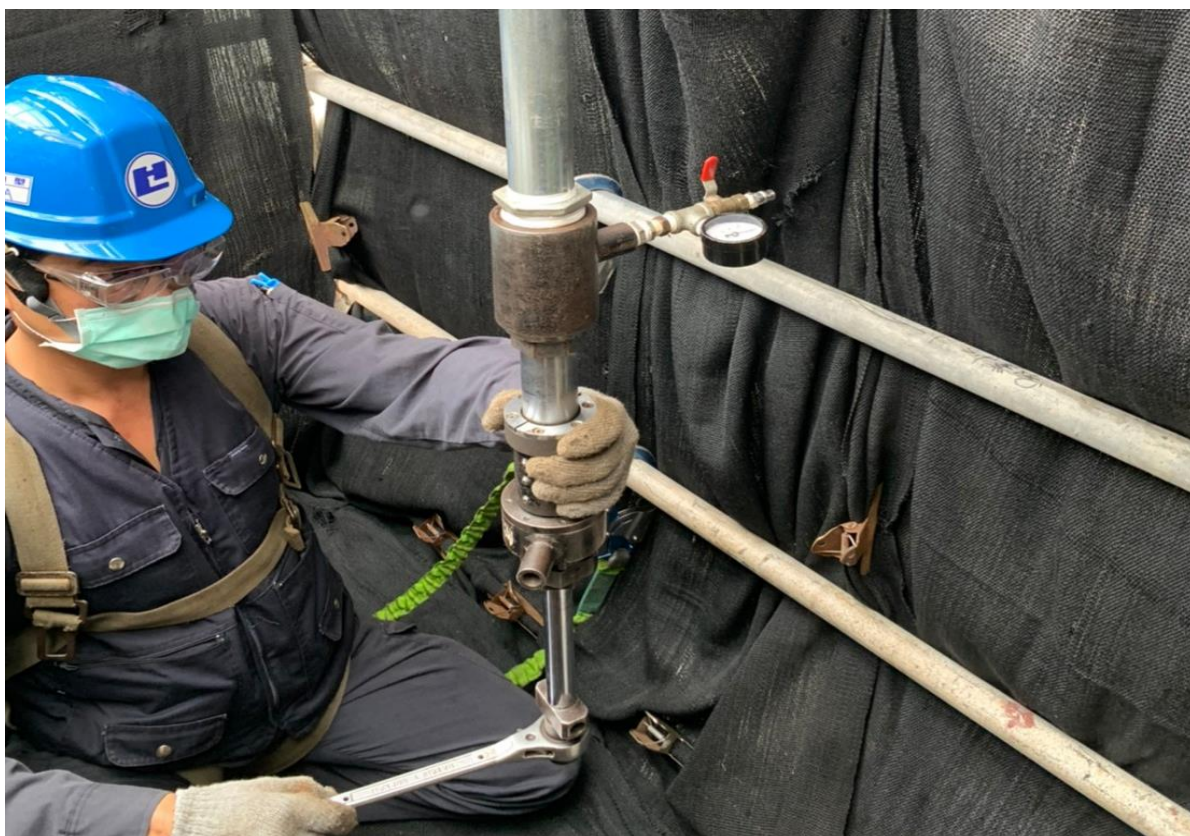

10. 人員執行開孔作業

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs

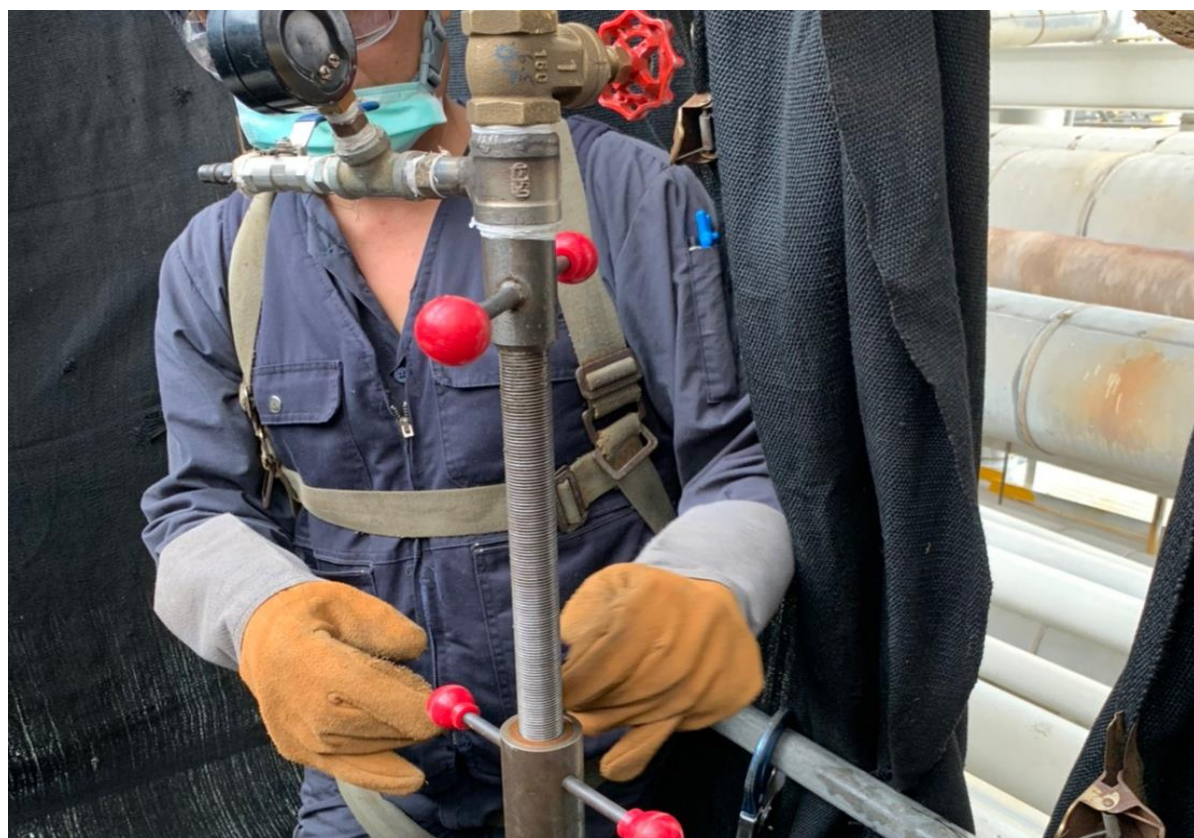

11. 人員進行阻斷作業



12. 排壓確認後人員切管作業

工程名稱：中部石化廠蒸氣 1"阻斷 x 2 pcs



13. 人員進行下堵作業



14. 施工完成
